


2025 年 6 月 1 3 日 大村樋水路付替

要約

住吉原 縄手地区の農地転用・開発・水路付替え変更による工事完了後の通水試験の写真

備考

長沢池水利組合は、令和 6 年 4 月 5 日地権者 8 名の要請による大村樋水路変更付替えについて計画に参画してきた、令和 7 年 6 月事業用地開発が完了、状況を観察報告する

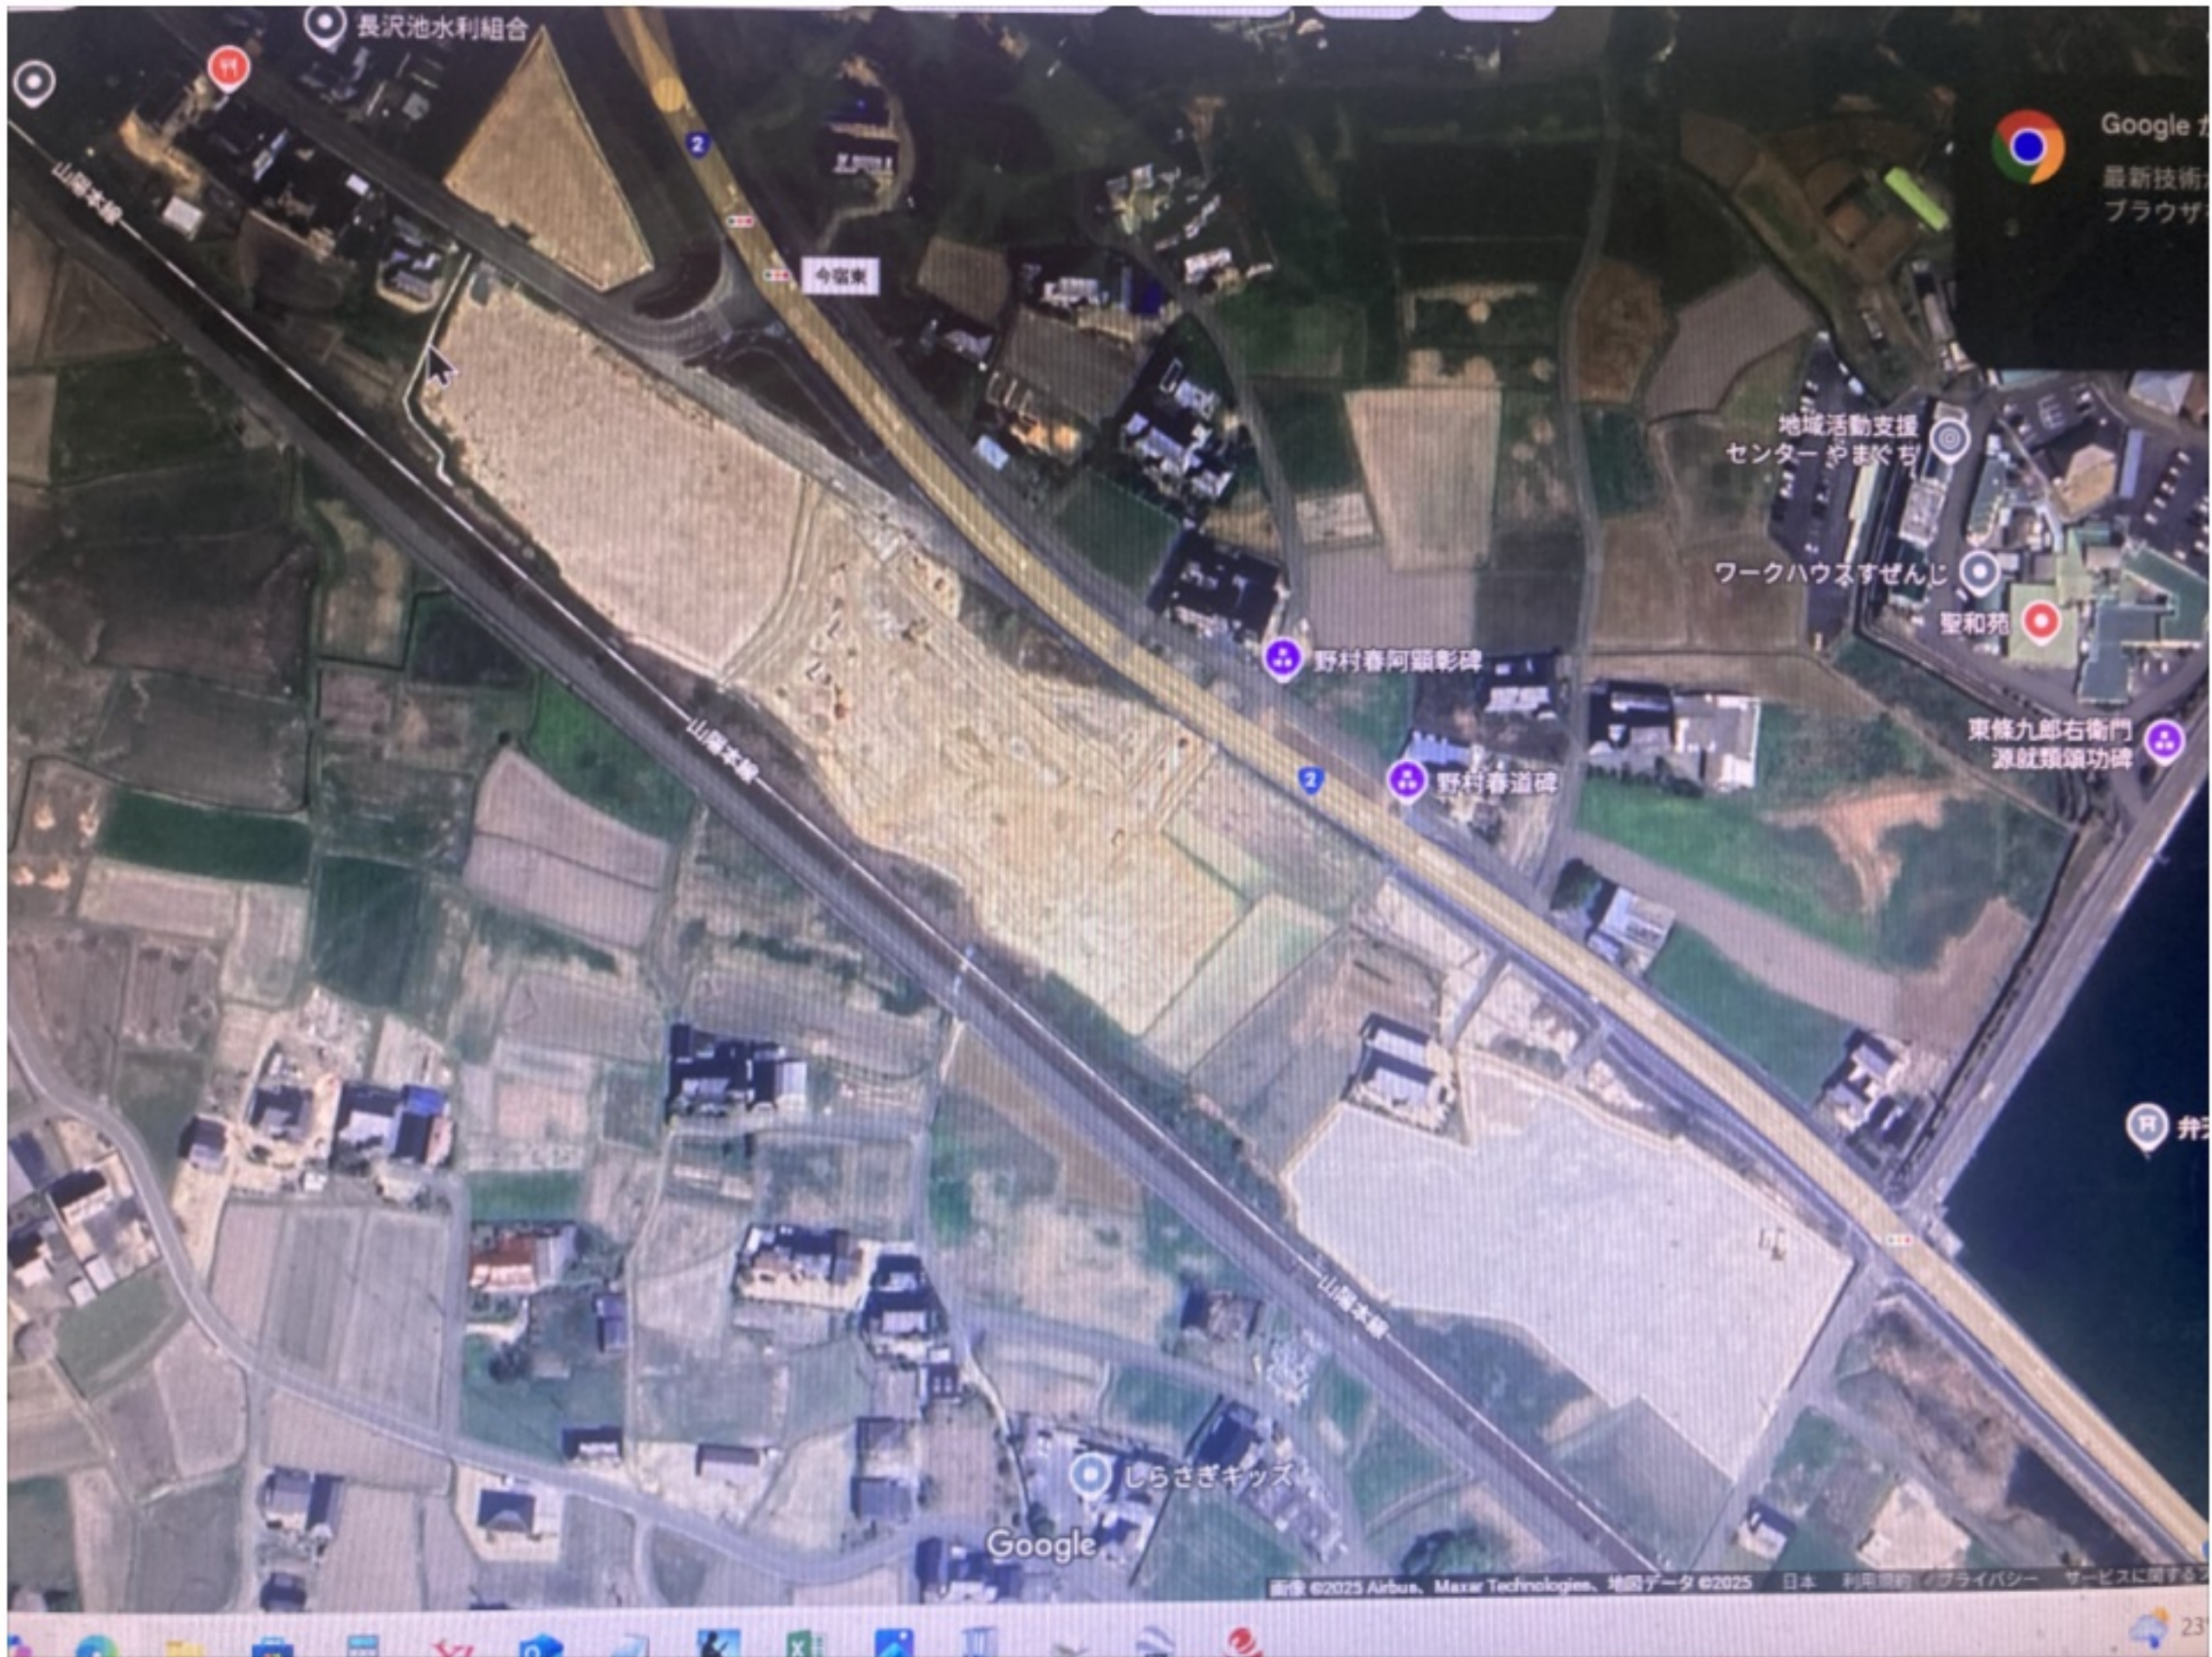



撮影日 2025-06-13 06:49
コメント 6月上旬の雨で長沢池樋の尻ゲートが満水で上部スレスレ



撮影日 2025-06-13 06:51:28
コメント 大亀谷（清和苑横）余水吐け上部越流の状態



撮影日 2025-06-13 06:48:11
コメント 上倚木の排水ゲート付近の水路の状況
不思議なことに例年の盛大な漏水が治っている 不思議？



撮影日 2025-06-13 06:4
7:12
コメント 野村宅後ろ付近の状況 水路高さにはまだ余裕がある



撮影日 2025-06-13 06:4
7:00
コメント 野村宅と鶴谷宅間の住吉原の排水ヒューム管からの流入状況
流入は認められない
(住吉原の開発に当たって
当事業用地からの排水は田
中川へ導いている)



撮影日 2025-06-13 06:4
6:31
コメント 鶴谷宅裏



撮影日 2025-06-13 06:4
5:53

コメント 旧今宿東会館付近
樋の尻ゲート上端とこの付近
の水路の高さが微妙に一致
している、この付近を余水吐
けとしている設計意図を感じ
る



撮影日 2025-06-13 06:4
5:32

コメント 村上邸、長通分岐部
付近 個々の部分も
樋の尻ゲート上端とこの付近
の水路の高さが微妙に一致
している
これは意図的なものを感じる
(撮影者コメント)



撮影日 2025-06-13 06:4
5:24

コメント 村上邸、長通分岐部
付近 個々の部分も
樋の尻ゲート上端とこの付近
の水路の高さが微妙に一致
している
これは意図的なものを感じる
(撮影者コメント)



撮影日 2025-06-13 06:45:19
コメント 長通分岐部付近 個々の部分も樋の尻ゲート上端とこの付近の水路の高さが微妙に一致している
これは意図的なものを感じる
(撮影者コメント)



撮影日 2025-06-14 04:56:37
コメント 縄手地区事業用地付近 この部分の真横に新設国道2号が通る
工事に合わせて600幅の排水ゲートを設置するよう段取りを進めている
排水は上後山暗渠水路を通じて長通水路へ流す予定
今は用水用として200φの給水パイプを設置している



撮影日 2025-06-13 06:40:15
コメント 縄手地区事業用地新規大村樋水路の状況
向こうが道の上へ向かう従来の水路、右が長沢池側の新水路



撮影日 2025-06-13 06:37:42

コメント 縄手地区事業用地
新規大村樋水路の状況
深さ30cm 余裕30cm



撮影日 2025-06-13 05:44:41

コメント 縄手ゲート付近満水の状況、大雨時は余水吐けとなっている、しかし線路横断の水管の径は300φであり排水には限度がある
(事業用地の横に600のゲートを設置、排水は国道2号の上後山暗渠へ流すようにしてもらう段取り)



撮影日 2025-06-13 05:44:18

コメント 縄手ゲート付近満水の状況、大雨時は余水吐けとなっている、しかし線路横断の水管の径は300φであり排水には限度がある
(事業用地の横に600のゲートを設置、排水は国道2号の上後山暗渠へ流すようにしてもらう段取り)



コメント

長通排水ゲートを開けて縄手地区の水位の様子を観察してみた



撮影日 2025-06-13 06:54:39

コメント

縄手堰付近の水位を調査するため
長通水路ゲートをオープンした場合



撮影日 2025-06-13 06:58:13

コメント

長通水路ゲートをオープン




撮影日 2025-06-13 07:43:04
コメント

長通水路ゲートをオープンした場合の縄手地区の水位を調査した
若干の水位低下がみられるが十分ではないような気がする



撮影日 2025-06-13 07:44:12
コメント

長通水路ゲートをオープンした場合の縄手地区の水位の様子

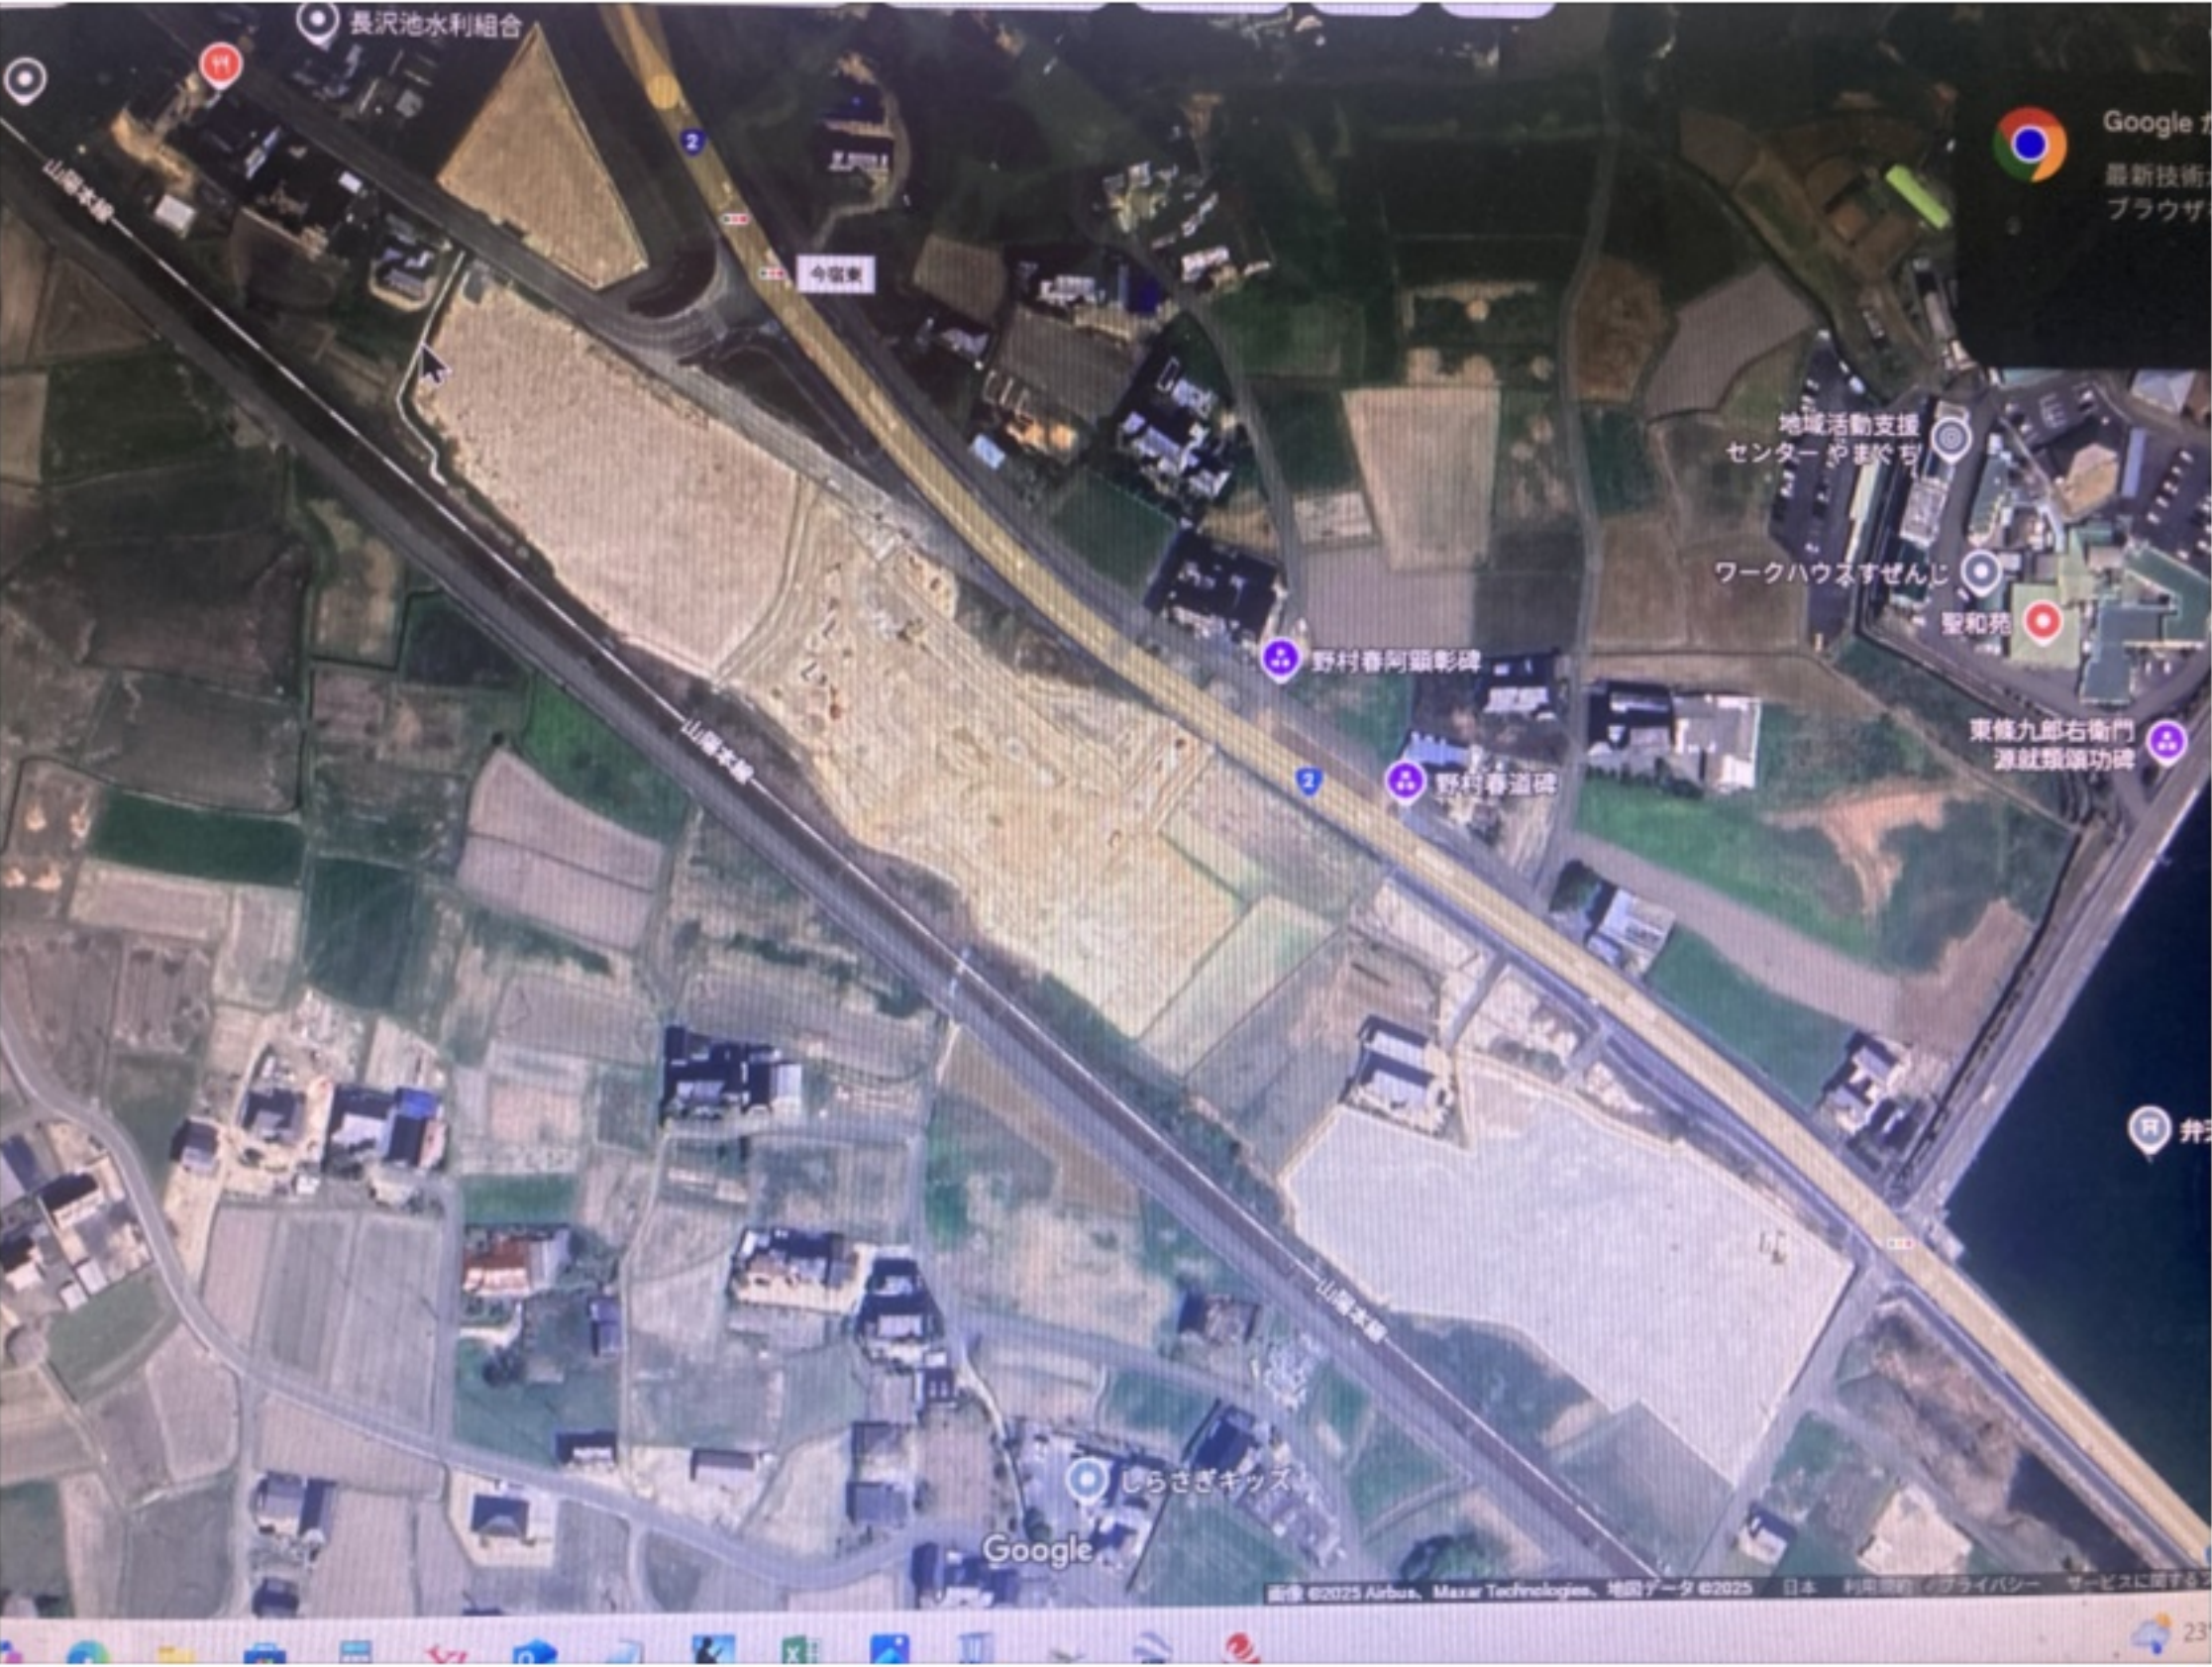

撮影日 2025-06-14 05:14:18
コメント 事業用地開発
住吉原及び縄手地区鳥瞰図（グーグルアース）
